

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 августа 2026 г.

№ 74798-П6

МОСКВА

Руководителям национальных проектов
(по списку)

В целях оптимизации бизнес-процесса управления изменениями, сокращения сроков рассмотрения соответствующих единых запросов на изменение паспортов национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов, а также сокращения документооборота в соответствии с решением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю.Григоренко от 19 августа 2026 г. № ДГ-П6-31155, Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации информирует:

об изменении подходов к рассмотрению единых запросов на изменение паспортов национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов в Аппарате Правительства Российской Федерации (Приложение № 1, Приложение № 5);

поэтапном переходе всех национальных проектов на представленную модель в сроки, определенные в Приложении № 2;

об отсутствии необходимости направления писем в Аппарат Правительства Российской Федерации по вопросам рассмотрения единых запросов на изменение куратору национального проекта / соответствующего проектного комитета / президиума Совета при Президенте Российской Федерации (за исключением отдельных поручений Правительства Российской Федерации);

о рассмотрении единых запросов на изменение в случае наличия замечаний от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, в том числе не критичных замечаний со стороны "ФПО", Минэкономразвития России, Минфина России (оранжевый шар) и урегулировании разногласий на заседании соответствующего проектного комитета в соответствии с пунктом

Описание оптимизации бизнес-процесса по управлению изменениями

Предлагается осуществить поэтапный переход (см. таблицу в Приложении № 2) всех национальных проектов на следующую модель управления изменениями национальных проектов и федеральных проектов, входящих в их состав:

1. Предлагается осуществлять **мониторинг единых запросов на изменение** указанных проектов **в подсистеме** управления национальными проектами **ГИИС "Электронный бюджет"** (далее - ГИИС "Электронный бюджет") **и осуществить отказ от входящих писем** федеральных органов исполнительной власти в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации (куратора национального проекта / соответствующего проектного комитета / президиума Совета при Президенте Российской Федерации) **о рассмотрении единых запросов на изменение** (за исключением отдельных поручений Правительства Российской Федерации);

Для организации данной работы **необходимо определить в каждом структурном подразделении Правительства Российской Федерации**, ответственном за реализацию национальных проектов, в соответствии с решением от 27 марта 2025 г. № ДГ-П6-10785, **сотрудника, ответственного за мониторинг ГИИС "Электронный бюджет"** (форма для заполнения - в Приложении № 4).

2. **Позиция Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации** (далее - Департамент) **будет отражаться в обязательном порядке на этапе "Федеральный проектный офис"** (далее - "ФПО") в ГИИС "Электронный бюджет" без подготовки докладных записок и резолюций в системе электронного документооборота Аппарата Правительства Российской Федерации (далее - МЭДО).

В случае формирования резолюции Департамента "Не согласовано" (красный шар) дальнейшее прохождение единого запроса на изменение **будет заблокировано** (основания указаны в Приложении № 6 и будут направлены в ФОИВ для организации работы).

В случае наличия замечаний в процессе согласования единых запросов на изменение от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, в том числе не критичных замечаний со стороны "ФПО", Минэкономразвития России, Минфина России (оранжевый шар), **такие запросы будут рассматриваться и разногласия урегулироваться на заседании соответствующего проектного комитета** в соответствии с пунктом 145 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее - Постановление № 1288), что позволит автоматизировать процесс прохождения единых запросов на изменение и сократить количество выпускаемых поручений Правительства Российской Федерации.

3. Предлагается поэтапно отказаться **от подготовки служебных записок и проектов резолюций кураторов национальных проектов** в системе МЭДО, перейдя на создание резолюций в ГИИС "Электронный бюджет".

При этом для проектов, запланированных к переходу на 2 и 3 этапах обязательно отражение в докладных записках позиции ФПО, отражаемой в ГИИС "Электронный бюджет" (см. пункт 2 описания процесса).

Департаментом определены этапы перехода национальных проектов на предложенную модель рассмотрения единых запросов на изменение в зависимости от их количества (см. Приложение № 2).

Для перехода на новую модель работы **для каждого этапа определен срок в 2 месяца**, в ходе которых Департамент обеспечит наставничество над назначенными сотрудниками в целях минимизации возможных рисков переходного периода.

4. Предложенный подход требует организации работы вице-премьеров непосредственно в ГИИС "Электронный бюджет", либо определения лиц, на которых будут возложены полномочия по утверждению резолюций решением кураторов национальных проектов.

Справочно: на этапе "Куратор" национального проекта в ГИИС "Электронный бюджет" проект резолюции создается ответственным от подразделения, указанным в пункте 1 настоящей докладной записки, и направляется на подписание вице-премьеру (куратору национального проекта) в соответствии со схемой процесса (Приложение № 5).

5. Предлагается отказаться от входящих писем – вносов единых запросов на изменение для рассмотрения на заседаниях проектных комитетов в 2 этапа:

1- по национальным проектам, ответственным секретарем по которым является Департамент (с 1 сентября 2026 г.);

2 - по национальным проектам, ответственным секретарем по которым являются иные структурные подразделения (с 1 ноября 2027 г., за исключением проектов "для служебного пользования", мониторинг которых осуществляется "на бумаге").

Список ответственных секретарей по национальным проектам прилагается в Приложении № 3.

На этапе "Проектный комитет" национального проекта ответственным секретарем будет осуществляться выгрузка из ГИИС "Электронный бюджет" поступивших на согласование единых запросов на изменение с учетом сроков, определенных в план-графиках проведения проектных комитетов для представления материалов на заседания (т.е. в дату представления материалов).

Дальнейшая процедура организации и проведения проектных комитетов не меняется, проводится с использованием системы межведомственного электронного документооборота Аппарата Правительства Российской Федерации (далее - МЭДО).

**Критерии отклонения единых запросов на изменение
на этапе "ФПО" в ГНИС Электронный бюджет ("красный шар")**


№ п/п	Причина отрицательного решения	Основание
1.	Изменения параметров, срок по которым уже наступил	139 пункт раздела 5 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"
2.	Отсутствие/неполнота обоснований предлагаемых изменений	пункт 26 раздел 3 Приложение № 4 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности
3.	"Амнистия" без детальных обоснований по причинам неисполнения параметров (без таблицы и/или пояснительной записки)	раздел 7 Приложение № 4 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности
4.	Нарушение сроков рассмотрения изменений (например, за несколько дней до даты наступления отчетного периода по исполняемому параметру)	147 пункт раздела 5 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"
		<i>Справочно: позднее чем за 5 (10) + 7 рабочих дней на основании 157 пункта Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации</i>

		<i>от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"</i>
5.	Изменения параметров Единого плана, НП, ФП в 4 квартале без решения Председателя Правительства РФ, или более чем на 10 процентов снижение показателя	139(1) пункт раздела 5 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" Временный порядок управления и мониторинга Единого плана 56. Внесение изменений в утверждаемую часть Единого плана в части изменения перечня и наименований национальных целей, параметров Указа и сведений их касающихся, ухудшения значений параметров Указа, установленных Указом, осуществляется после внесения соответствующих изменений в Указ или согласования таких изменений Президентом Российской Федерации. 60. Внесение изменений в утверждаемую часть Единого плана, за исключением изменения наименований параметров Указа и ухудшения значений параметров Указа, установленных Указом, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Приведение в соответствие паспортов инструментов достижения Единого плана к параметрам новой редакции утверждаемой части Единого плана осуществляется одновременно с утверждением новой редакции утверждаемой части Единого плана или в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента утверждения новой редакции утверждаемой части Единого плана (если иное не установлено решением Совета, президиума Совета или Председателя Правительства Российской Федерации). ...Единые запросы формируются по основанию "Изменение параметров проектов с целью приведения их в соответствие с Единым планом по достижению

		национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
6.	Уменьшение значений показателей на 2030 год без решения Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам	139(1) пункт раздела 5 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" + Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам от 28 декабря 2024 г. № Пр-2803
7.	Изменение финансового обеспечения без изменения значений взаимосвязанных параметров (результатов, показателей) без обоснований	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2023 г. № 2050 "Об утверждении правил принятия решений об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства и объектах недвижимого имущества" + 139(1) пункт раздела 5 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"
8.	Нарушение в части дублирования параметров: - Дублирование параметра - ОЗР, показатели, мероприятия (в паспорте уже присутствует аналогичное наименование) - Дублирование атрибутов (линейка)	Приложение 1 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности: 9.6. Характеристика мероприятия (результата) заполняется в том числе на основании информации, содержащейся в справочнике мероприятий (результатов). Характеристика мероприятия (результата) содержит описательную и структурированную часть. Структурированная часть характеристики мероприятия

	значений дублируется структурированной частью характеристики, дублирование структурированной частью характеристики линейки значений другого мероприятия (результата) - Дублирование описательной части характеристики (не дублирует плановые значения мероприятия (результата) и значения параметров структурированной части его характеристики, которым должно соответствовать мероприятие (результат)	(результата) формируется на основании справочника параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) в системе "Электронный бюджет" (далее – справочник параметров характеристик) и включает в себя: – наименование параметра (параметров) структурированной части характеристики – дополнительные количественные параметры, не дублирующие плановые значения мероприятия (результата), которым должно соответствовать мероприятие (результат); – единицу измерения параметра (параметров) структурированной части характеристики; – значения параметра (параметров) структурированной части характеристики по годам реализации. 7.5. Допускается отражение одного и того же ОЗР, одной и той же задачи одновременно в нескольких федеральных проектах, входящих в состав одного национального проекта. В каждом из указанных федеральных проектов достижение такого ОЗР, задачи обеспечивается уникальным перечнем мероприятий (результатов). Дублирование мероприятий (результатов) между ОЗР и (или) задачами не допускается.
9.	Включение в запрос изменений параметров, по которым уже сформирован и не утвержден ЕЗН	Приложение 4 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности: 28. Не допускается включение в единый запрос на изменение изменений параметров паспорта проекта, по которым уже сформирован и не утвержден единый запрос на изменение (за исключением одного запроса на изменение с категорией изменения "Ежегодная актуализация и планирование национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов на очередной финансовый год").

**Схема процесса по пилотному проекту согласования единых запросов на изменение
в ГИИС "Электронный бюджет"**

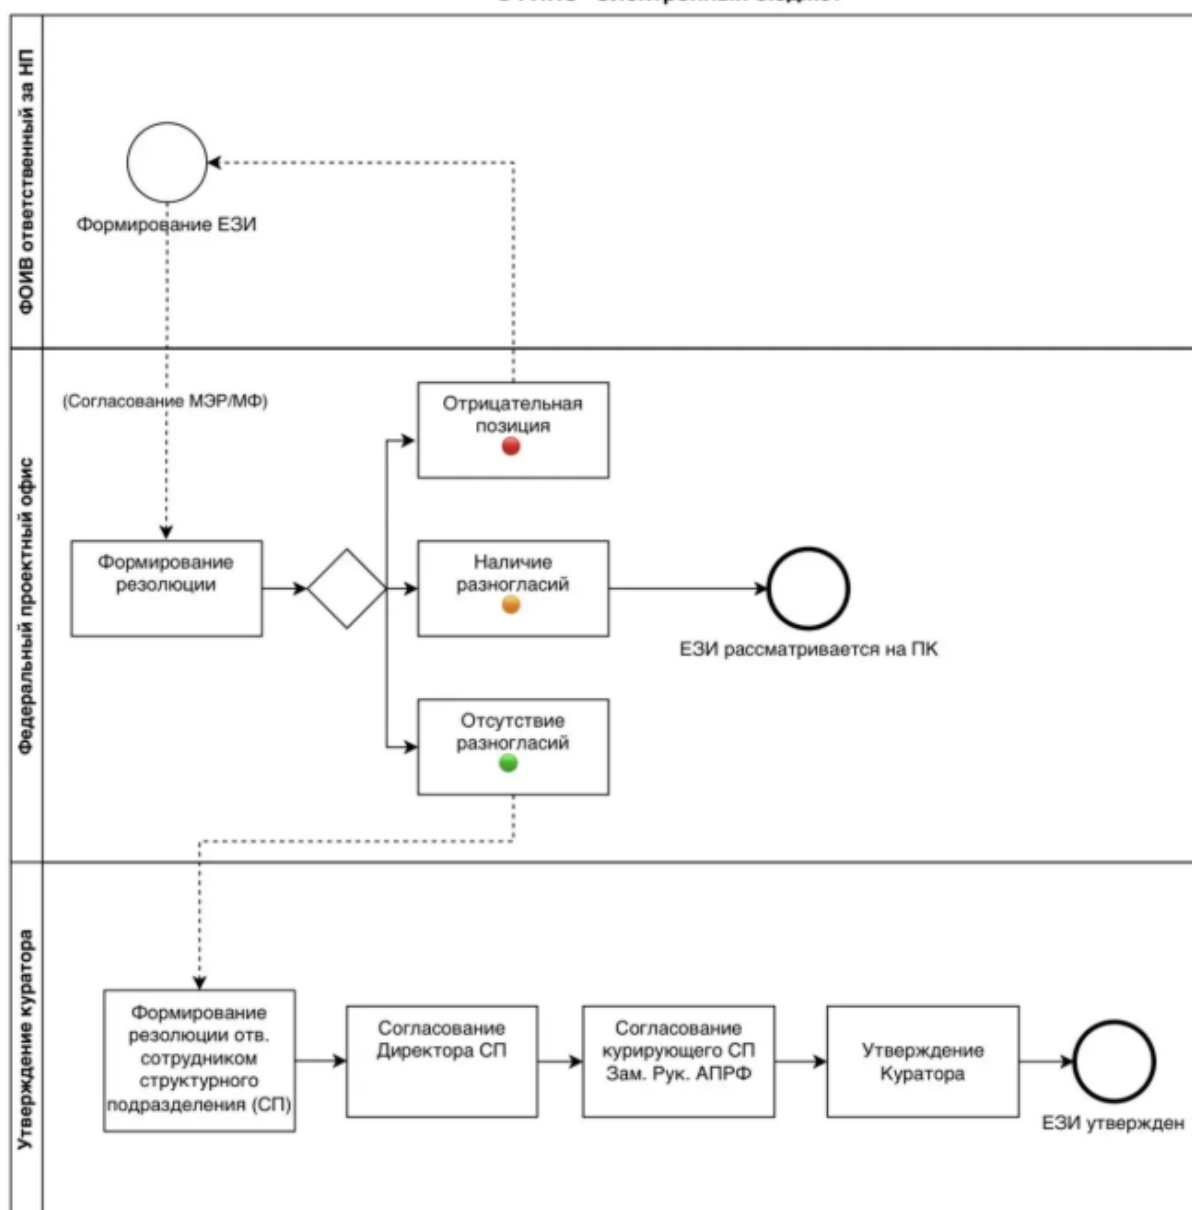

Распределение структурных подразделений Аппарата Правительства Российской Федерации

Приложение № 2

№ п/п	Этап	Национальный проект	Куратор	Ответственное структурное подразделение АПРФ	Срок перехода
1	2	3	4	5	6
1	1	Молодежь и дети	Д.Н.Чернышенко	Департамент просвещения, высшего образования и науки	1 сентября - 2 ноября 2026 г.
2	1	Эффективная и конкурентная экономика	А.В.Новак	Департамент экономического развития и финансов	1 сентября - 2 ноября 2026 г.
3	1	Экологическое благополучие	Д.Н.Патрушев	Департамент природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса	1 сентября - 2 ноября 2026 г.
4	1	Технологическое обеспечение продовольственной безопасности	Д.Н.Патрушев	Департамент природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса	1 сентября - 2 ноября 2026 г.
5	1	Продолжительная и активная жизнь	Т.А.Голикова	Департамент здравоохранения	1 сентября - 2 ноября 2026 г.
6	1	Семья	Т.А.Голикова	Департамент социального развития	1 сентября - 2 ноября 2026 г.
7	2	Новые технологии сбережения здоровья	Т.А.Голикова	Департамент здравоохранения	2 ноября - 30 декабря 2026 г.
8	2	Кадры	Т.А.Голикова	Департамент социального развития	2 ноября - 30 декабря 2026 г.
9	2	Инфраструктура для жизни	М.Ш.Хуснуллин	Департамент строительства	2 ноября - 30 декабря 2026 г.
10	2	Международная кооперация и экспорт	Д.В.Мантуров	Департамент экономического развития и финансов	2 ноября - 30 декабря 2026 г.
11	2	Новые атомные и энергетические технологии	А.В.Новак	Департамент энергетики	2 ноября - 30 декабря 2026 г.
12	2	Туризм и гостеприимство	Д.Н.Чернышенко	Департамент культуры, спорта, туризма и национальной политики	2 ноября - 30 декабря 2026 г.
13	2	Беспилотные авиационные системы	В.Г.Савельев	Департамент транспорта	2 ноября - 30 декабря 2026 г.
14	2	Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года	Д.В.Мантуров	Департамент оборонно-промышленного комплекса	2 ноября - 30 декабря 2026 г.
15	3	Средства производства и автоматизации	Д.В.Мантуров	Департамент промышленности	11 января - 15 марта 2027 г.
16	3	Технологическое обеспечение биоэкономики	Д.В.Мантуров	Департамент экономического развития и финансов	11 января - 15 марта 2027 г.
17	3	Промышленное обеспечение транспортной мобильности	Д.В.Мантуров	Департамент оборонно-промышленного комплекса	11 января - 15 марта 2027 г.
18	3	Новые материалы и химия	Д.В.Мантуров	Департамент промышленности	11 января - 15 марта 2027 г.
19	3	Эффективная транспортная система	В.Г.Савельев	Департамент транспорта	11 января - 15 марта 2027 г.
20	-	Экономика данных и цифровая трансформация государства	Д.Ю.Григоренко	Департамент информационных технологий	Переход осуществлен

Распределение ответственных секретарей проектных комитетов

Приложение № 3

№ п/п	Национальный проект	Ответственный секретарь	Структурное подразделение
1	2	3	4
1	Молодежь и дети	Федоров Федор Андреевич	Департамент проектной деятельности
2	Эффективная и конкурентная экономика	Кириухин Никита Сергеевич	Департамент проектной деятельности
3	Экологическое благополучие	Камнева Анастасия Сергеевна	Департамент проектной деятельности
4	Технологическое обеспечение продовольственной безопасности	Камнева Анастасия Сергеевна	Департамент проектной деятельности
5	Продолжительная и активная жизнь	Идрисова Диана Векиловна	Департамент проектной деятельности
6	Семья	Кириухин Никита Сергеевич	Департамент проектной деятельности
7	Новые технологии сбережения здоровья	Камнева Анастасия Сергеевна	Департамент проектной деятельности
8	Кадры	Прибытков Артем Андреевич	Департамент проектной деятельности
9	Инфраструктура для жизни	Береснева Наталья Сергеевна	Департамент проектной деятельности
10	Международная кооперация и экспорт	Прибытков Артем Андреевич	Департамент проектной деятельности
11	Новые атомные и энергетические технологии	Береснева Наталья Сергеевна	Департамент проектной деятельности
12	Туризм и гостеприимство	Федоров Федор Андреевич	Департамент проектной деятельности
13	Беспилотные авиационные системы	Мещеряков Анатолий Анатольевич	Департамент транспорта
14	Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года	Архипов Николай Федорович	Департамент оборонно-промышленного комплекса
15	Средства производства и автоматизации	Кириухин Никита Сергеевич	Департамент проектной деятельности
16	Технологическое обеспечение биоэкономики	Камнева Анастасия Сергеевна	Департамент проектной деятельности
17	Промышленное обеспечение транспортной мобильности	Идрисова Диана Векиловна	Департамент проектной деятельности
18	Новые материалы и химия	Идрисова Диана Векиловна	Департамент проектной деятельности
19	Эффективная транспортная система	Береснева Наталья Сергеевна	Департамент проектной деятельности
20	Экономика данных и цифровая трансформация государства	Прибытков Артем Андреевич	Департамент проектной деятельности
